




VITE & GOURMAND

Documentation de gestion de projet

Projet ECF

Titre professionnel

Développeur Web et Web Mobile

Yoann LAMOUILLE

2026

SOMMAIRE

1 Organisation et suivi du projet

Le développement de l'application Vite & Gourmand a été organisé de manière progressive afin de faciliter le suivi des fonctionnalités à réaliser et de conserver un historique des différentes évolutions du projet.

Le suivi du développement s'est principalement appuyé sur Trello pour l'organisation des tâches et sur Git et GitHub pour le versionnement du code source.

Les différentes fonctionnalités ont été réalisées progressivement, testées en environnement local puis intégrées au projet. Des phases de vérification et de correction ont également été effectuées au cours du développement, notamment lors du déploiement et des contrôles finaux de l'application.

Cette organisation permet de suivre l'avancement du projet, de séparer les différentes fonctionnalités lors de leur développement et de conserver l'historique des modifications apportées au code.

1.1 Outil de gestion utilisé

Le suivi du projet a été réalisé à l'aide de Trello. Cet outil a permis de centraliser les différentes tâches à réaliser et de visualiser l'avancement du développement de l'application.

Le tableau a été organisé par grands domaines fonctionnels et techniques plutôt que sous la forme d'un workflow classique « À faire / En cours / Terminé ». Chaque colonne correspond à une partie du projet, par exemple la conception, l'authentification, la gestion des menus, la commande, les différents espaces utilisateurs, le backend, le déploiement ou encore l'accessibilité.

Les fonctionnalités ont été représentées sous forme de cartes. Une fois une tâche réalisée et vérifiée, celle-ci était marquée comme terminée. Certaines cartes comportent également des checklists permettant de suivre plusieurs étapes d'une même fonctionnalité.

Cette organisation a permis de conserver une vue globale du projet tout en suivant séparément l'avancement de chaque domaine.

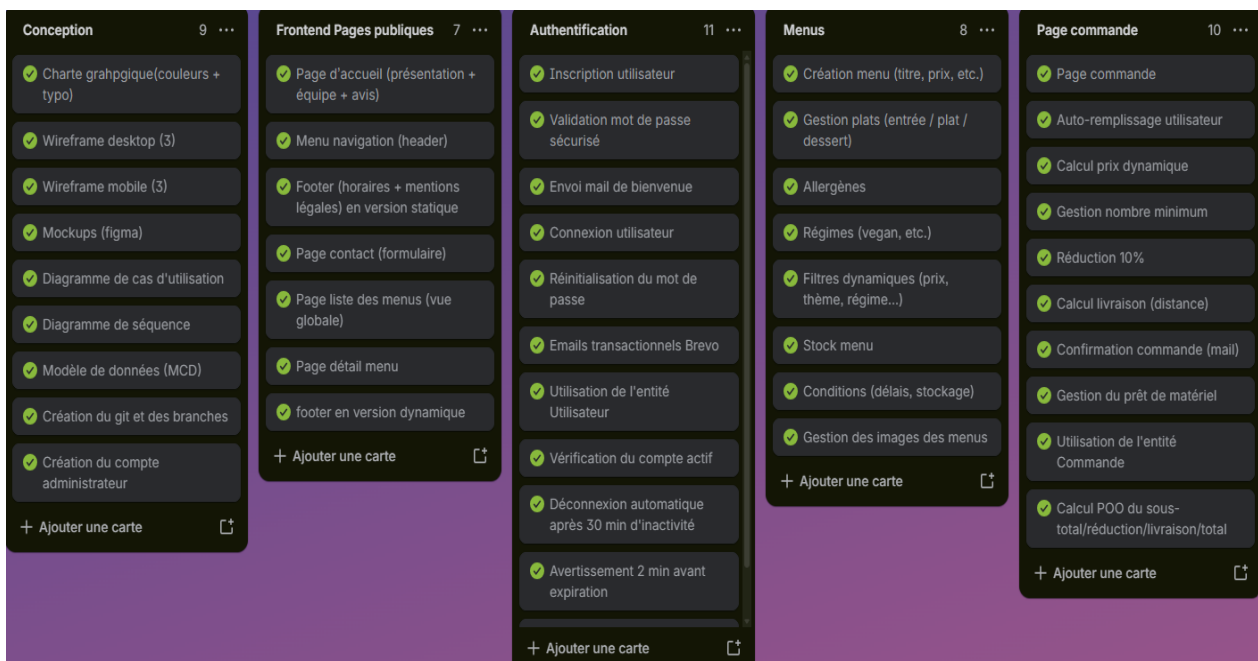


Figure 1: Organisation des fonctionnalités principales du projet dans Trello

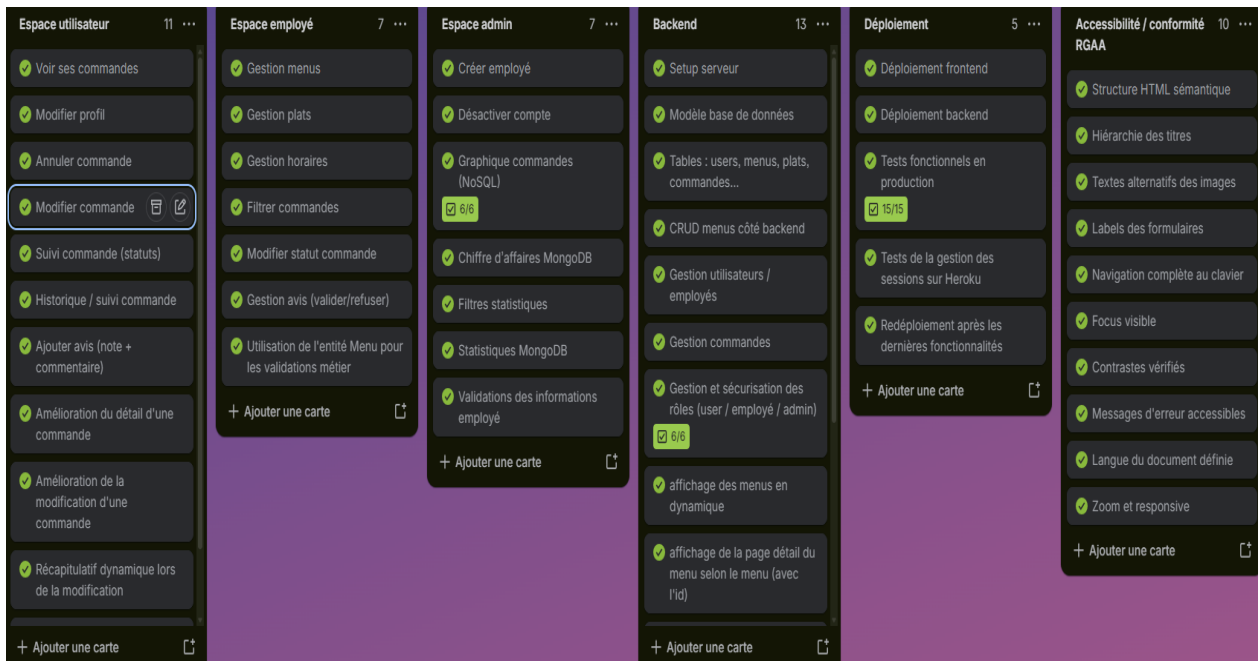


Figure 2: Suivi du backend, du déploiement et de l'accessibilité dans Trello

1.2 Organisation du tableau Trello

Le tableau Trello a été découpé en plusieurs listes correspondant aux principales parties du projet. Cette organisation permet de regrouper les tâches selon leur domaine fonctionnel ou technique. Les premières listes concernent la conception et les fonctionnalités principales de l'application : conception des maquettes et diagrammes, pages publiques, authentification, gestion des menus, processus de commande et formulaire de contact.

D'autres listes sont consacrées aux différents niveaux d'accès de l'application : espace utilisateur, espace employé et espace administrateur. Elles permettent de distinguer clairement les fonctionnalités disponibles selon le rôle de l'utilisateur connecté.

Une partie du tableau regroupe également les tâches liées au backend, au déploiement et aux vérifications d'accessibilité. Enfin, les listes « Documentation » et « Livrables finaux » permettent de suivre la préparation des documents et les dernières vérifications nécessaires avant la présentation du projet.

Les cartes sont validées progressivement lorsqu'une fonctionnalité est développée et vérifiée. Des checklists sont utilisées pour certaines tâches nécessitant plusieurs contrôles ou plusieurs étapes.

1.3 Suivi de l'avancement

Le tableau Trello a été mis à jour progressivement au cours du développement. Les cartes correspondent aux fonctionnalités ou aux tâches nécessaires à la réalisation de l'application.

Lorsqu'une fonctionnalité était développée, elle était testée en environnement local avant d'être considérée comme terminée. Certaines fonctionnalités ont nécessité plusieurs étapes de développement ou de vérification ; des checklists ont alors été utilisées afin de suivre séparément ces différentes étapes.

Le tableau a également évolué au cours du projet. De nouvelles tâches ont été ajoutées lorsque des besoins complémentaires ont été identifiés, notamment lors des tests, du déploiement et des vérifications finales d'accessibilité et de responsive design.

Cette méthode a permis de visualiser les fonctionnalités déjà réalisées et celles restant à finaliser, tout en conservant une organisation par domaine tout au long du développement.

2 Gestion du versionnement avec Git et GitHub

Le code source de l'application Vite & Gourmand a été versionné avec Git et hébergé sur GitHub. L'utilisation d'un système de versionnement permet de conserver l'historique des modifications, de travailler sur les fonctionnalités de manière isolée et de revenir à un état antérieur du projet si nécessaire.

Une organisation basée sur plusieurs branches a été utilisée afin de séparer le développement des fonctionnalités de la version principale de l'application.

2.1 Organisation du dépôt Git.

Le projet est centralisé dans un dépôt GitHub contenant le code source de l'application ainsi que les fichiers nécessaires à son installation et à son exécution.

Deux branches principales ont été utilisées : main, correspondant à la version stable du projet, et develop, utilisée pour regrouper les fonctionnalités développées avant leur intégration dans la branche principale.

Les nouvelles fonctionnalités ont été développées dans des branches dédiées créées à partir de develop. Cette organisation permet d'isoler les modifications et d'éviter de travailler directement sur la version stable de l'application.

Les branches de fonctionnalités utilisent une convention de nommage permettant d'identifier leur objectif, par exemple feature/legal-pages pour le développement des pages légales. Une fois une fonctionnalité terminée et vérifiée, les modifications sont enregistrées avec Git, envoyées sur le dépôt distant puis intégrées dans les branches principales.

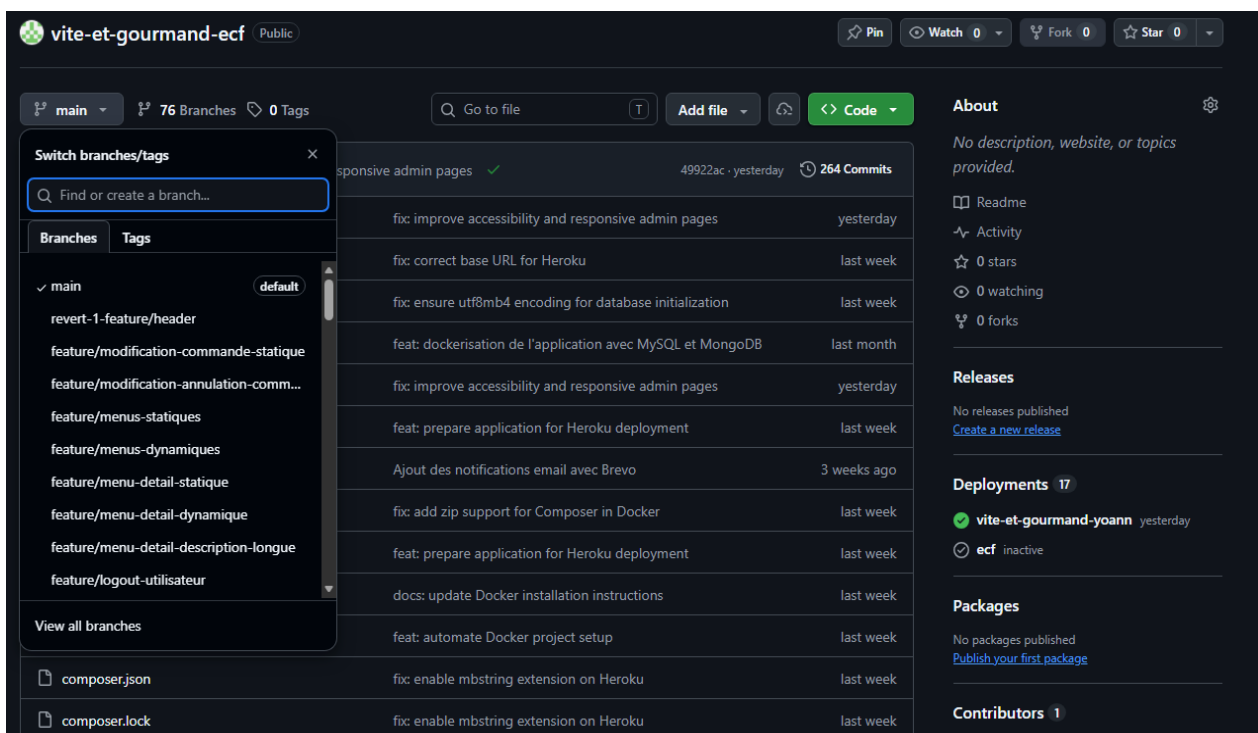


Figure 3: Aperçu des branches utilisées dans le dépôt GitHub

2.2 Utilisation des branches

Le développement du projet s'est appuyé sur plusieurs types de branches afin de séparer les différentes étapes de réalisation et de limiter les modifications directes sur la version principale de l'application.

La branche main correspond à la version stable du projet. Une branche develop a également été utilisée pour intégrer et vérifier les fonctionnalités avant leur ajout à la branche principale.

Pour chaque nouvelle fonctionnalité ou évolution importante, une branche dédiée était créée à partir de develop. Les branches étaient nommées selon leur objectif, par exemple feature/menus-dynamiques, feature/logout-utilisateur ou encore feature/legal-pages.

Une fois le développement terminé et testé, les modifications étaient enregistrées à l'aide de commits puis envoyées sur le dépôt distant GitHub. Une Pull Request permettait ensuite d'intégrer la branche de fonctionnalité dans develop, puis les modifications validées étaient intégrées dans main.

Cette organisation permet de développer les fonctionnalités séparément, de conserver un historique clair des modifications et de réduire le risque d'introduire directement une modification non vérifiée dans la version stable.

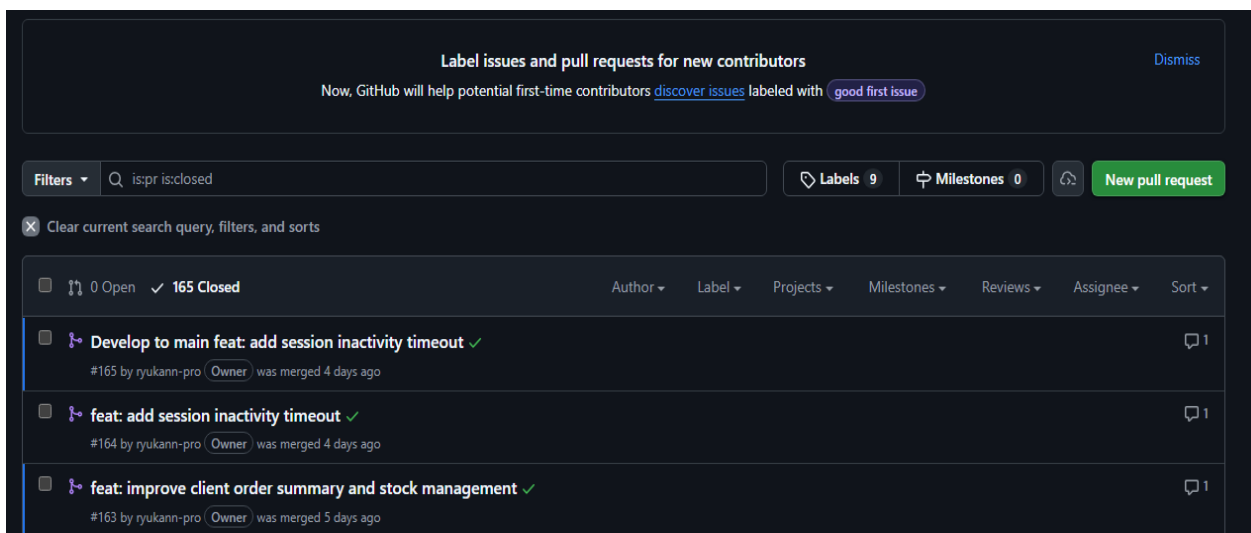


Figure 4: Exemple de Pull Requests

2.3 Versionnement et commits

Les différentes étapes du développement ont été enregistrées régulièrement à l'aide de commits Git. Chaque commit permet de conserver un état précis du projet et d'identifier les modifications apportées au code source.

Les messages de commit ont été rédigés de manière à indiquer la nature de la modification réalisée. Des préfixes tels que feat:, fix: ou docs: ont notamment été utilisés pour différencier l'ajout d'une fonctionnalité, la correction d'un problème ou la modification de la documentation. Les commits étaient réalisés sur les branches de fonctionnalités correspondantes avant leur envoi vers le dépôt distant GitHub. Cette méthode permet de conserver un historique détaillé du développement et facilite l'identification d'une modification en cas de problème.

L'historique Git constitue ainsi une trace des différentes évolutions du projet, depuis les premières fonctionnalités jusqu'aux corrections réalisées lors des tests, du déploiement et des vérifications finales.

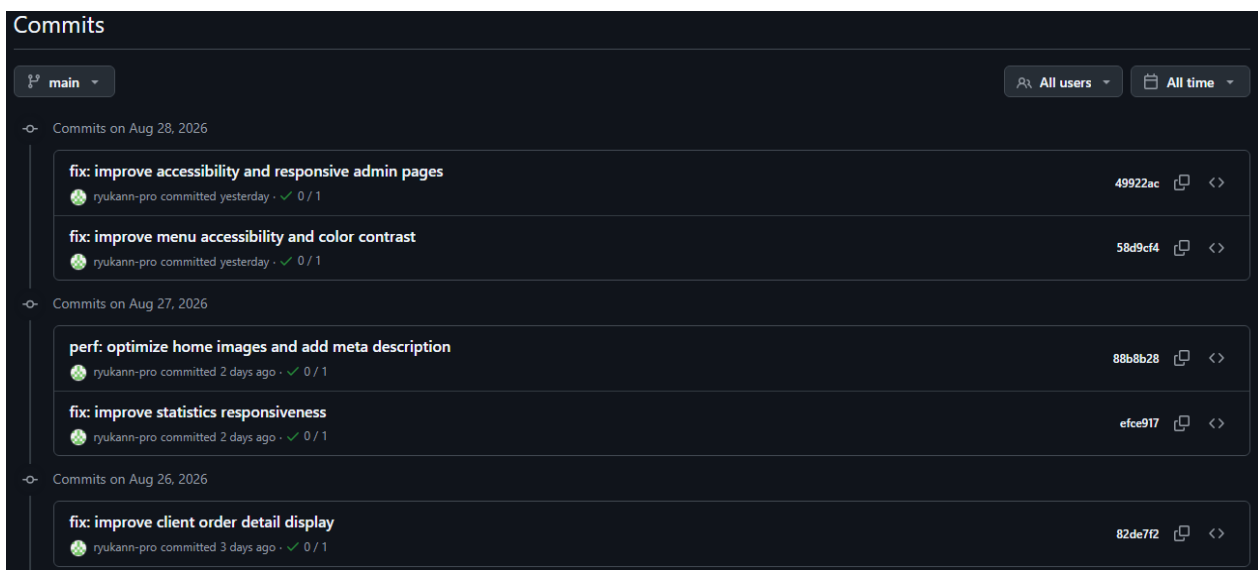


Figure 5: Extrait de l'historique des commits du projet

2.4 Intégration et validation des modifications

Avant leur intégration dans la version stable de l'application, les modifications développées sur les branches dédiées étaient vérifiées afin de s'assurer du bon fonctionnement des fonctionnalités concernées.

Après ces vérifications, les branches de fonctionnalités étaient fusionnées dans develop à l'aide de Pull Requests sur GitHub. Cette branche permettait de regrouper les différentes évolutions avant leur intégration dans main.

Une fois les modifications validées, une nouvelle Pull Request permettait de fusionner develop dans main. La branche main conservait ainsi une version stable du projet pouvant être utilisée pour le déploiement.

En cas de correction après intégration ou après déploiement, une nouvelle modification pouvait être réalisée puis suivre à nouveau ce processus de versionnement et de validation.

3 Organisation du développement

Le développement de l'application a été réalisé progressivement en suivant les différentes fonctionnalités définies lors de la conception du projet. L'objectif était de construire l'application par étapes, en vérifiant régulièrement le fonctionnement des éléments développés avant de poursuivre avec les fonctionnalités suivantes.

Le développement a commencé par la mise en place de la structure générale de l'application et des premières pages, avant d'intégrer progressivement les fonctionnalités dynamiques, l'authentification, les différents espaces utilisateurs et les règles métier. Les phases de tests, de correction et de déploiement ont accompagné cette progression.

3.1 Développement progressif des fonctionnalités

Le développement de l'application a été réalisé progressivement afin de construire et de valider les différentes fonctionnalités par étapes.

Les premières phases ont principalement concerné la conception et la mise en place des pages publiques de l'application. Les pages ont d'abord été intégrées à partir des maquettes réalisées, puis les contenus initialement statiques ont progressivement été remplacés par des données provenant de la base de données.

Les fonctionnalités liées à l'authentification ont ensuite été développées, notamment l'inscription, la connexion, la réinitialisation du mot de passe et la gestion des sessions. Le développement s'est poursuivi avec la gestion des menus et des plats, puis avec le parcours de commande et l'application des différentes règles métier.

Les espaces dédiés aux utilisateurs, aux employés et aux administrateurs ont ensuite été complétés progressivement en fonction des droits associés à chaque rôle. Les fonctionnalités de gestion, de suivi des commandes, des avis, des horaires et des statistiques ont ainsi été intégrées au fur et à mesure du développement.

Cette progression a permis de vérifier régulièrement le fonctionnement de l'application et de corriger les problèmes rencontrés avant de poursuivre avec les étapes suivantes.

3.2 Vérification et validation des fonctionnalités

Chaque fonctionnalité développée a été vérifiée avant d'être considérée comme terminée. Les tests étaient réalisés principalement en environnement local afin de contrôler le comportement de l'application et de vérifier que les résultats obtenus correspondaient aux fonctionnalités attendues. Les vérifications ont notamment porté sur les principaux parcours de l'application : inscription et connexion des utilisateurs, affichage des menus, création et modification des commandes, calcul du prix, gestion du stock, suivi des différents statuts ainsi que les fonctionnalités accessibles aux employés et aux administrateurs.

Les différents rôles ont également été testés afin de vérifier qu'un utilisateur ne puisse accéder qu'aux pages et aux actions correspondant à ses droits.

Lorsqu'un problème était identifié, la fonctionnalité concernée était corrigée puis testée à nouveau avant d'être considérée comme terminée dans le suivi du projet.

Cette méthode de validation progressive a permis de limiter l'accumulation d'erreurs et de conserver une application fonctionnelle au fur et à mesure de son développement.

3.3 Corrections et améliorations

Plusieurs phases de correction et d'amélioration ont été réalisées au cours du développement à la suite des différents tests effectués sur l'application.

Des ajustements ont notamment été apportés au responsive afin d'assurer une utilisation correcte de l'application sur ordinateur, tablette et mobile. Certains composants, comme le graphique des statistiques de l'espace administrateur, ont ainsi été adaptés aux différentes tailles d'écran.

Une attention particulière a également été portée aux performances et à l'accessibilité. La taille de certaines images a été optimisée et plusieurs problèmes détectés lors des contrôles avec Lighthouse/PageSpeed Insights et WAVE ont été corrigés, notamment des contrastes insuffisants, la hiérarchie de certains titres et différents éléments liés à la structure des pages.

Après chaque correction importante, les pages concernées étaient de nouveau vérifiées afin de s'assurer que la modification apportée n'entraînait pas de régression sur le reste de l'application.

Ces différentes améliorations ont permis d'aboutir progressivement à une version plus stable, responsive et accessible de l'application.

3.4 Passage en production et vérifications finales

Une fois les principales fonctionnalités développées et vérifiées en environnement local, l'application a été déployée afin de tester son fonctionnement dans un environnement de production.

Après le déploiement, les principaux parcours ont été testés à nouveau afin de vérifier le fonctionnement de l'authentification, des différents rôles, des commandes, de l'envoi des e-mails, des bases de données ainsi que des espaces utilisateur, employé et administrateur.

Certaines différences entre l'environnement local et l'environnement de production ont nécessité des ajustements de configuration et des corrections. Après chaque modification importante, une nouvelle version était envoyée sur le dépôt GitHub puis redéployée afin d'effectuer de nouvelles vérifications.

Une dernière phase de contrôle a ensuite été réalisée sur les principales pages de l'application, notamment concernant le responsive, les performances et l'accessibilité.

Cette étape a permis de valider le fonctionnement global de l'application dans son environnement final avant la présentation du projet.

4 Conclusion

L'organisation mise en place tout au long du projet a permis de suivre progressivement le développement de l'application Vite & Gourmand et de conserver une trace des différentes évolutions réalisées.

L'utilisation de Trello a facilité le découpage et le suivi des fonctionnalités, tandis que Git et GitHub ont permis d'assurer le versionnement du code et de séparer les développements grâce à l'utilisation de branches dédiées.

Les vérifications réalisées tout au long du développement, puis après le déploiement, ont permis d'identifier et de corriger progressivement les problèmes rencontrés avant d'aboutir à la version finale de l'application.
